

REPORTING AU COMITÉ DE DIRECTION

MobilityPulse : sécuriser le déploiement en 12 semaines

STATUT GLOBAL

• VERT • VERT • VERT

Aucun obstacle bloquant

Sécuriser l'adoption d'un prototype existant : organisation, gouvernance, accompagnement.

Ouassim Megrad · Lead Data · équipe Megslab

3 réponses aux 3 limites constatées

1

Organisation

Un plan projet en 12 semaines

2

Gouvernance

Des rôles clairs, un arbitrage


3

Accompagnement

Une formation par profil

PLANNING

12 semaines, 4 phases, 5 jalons

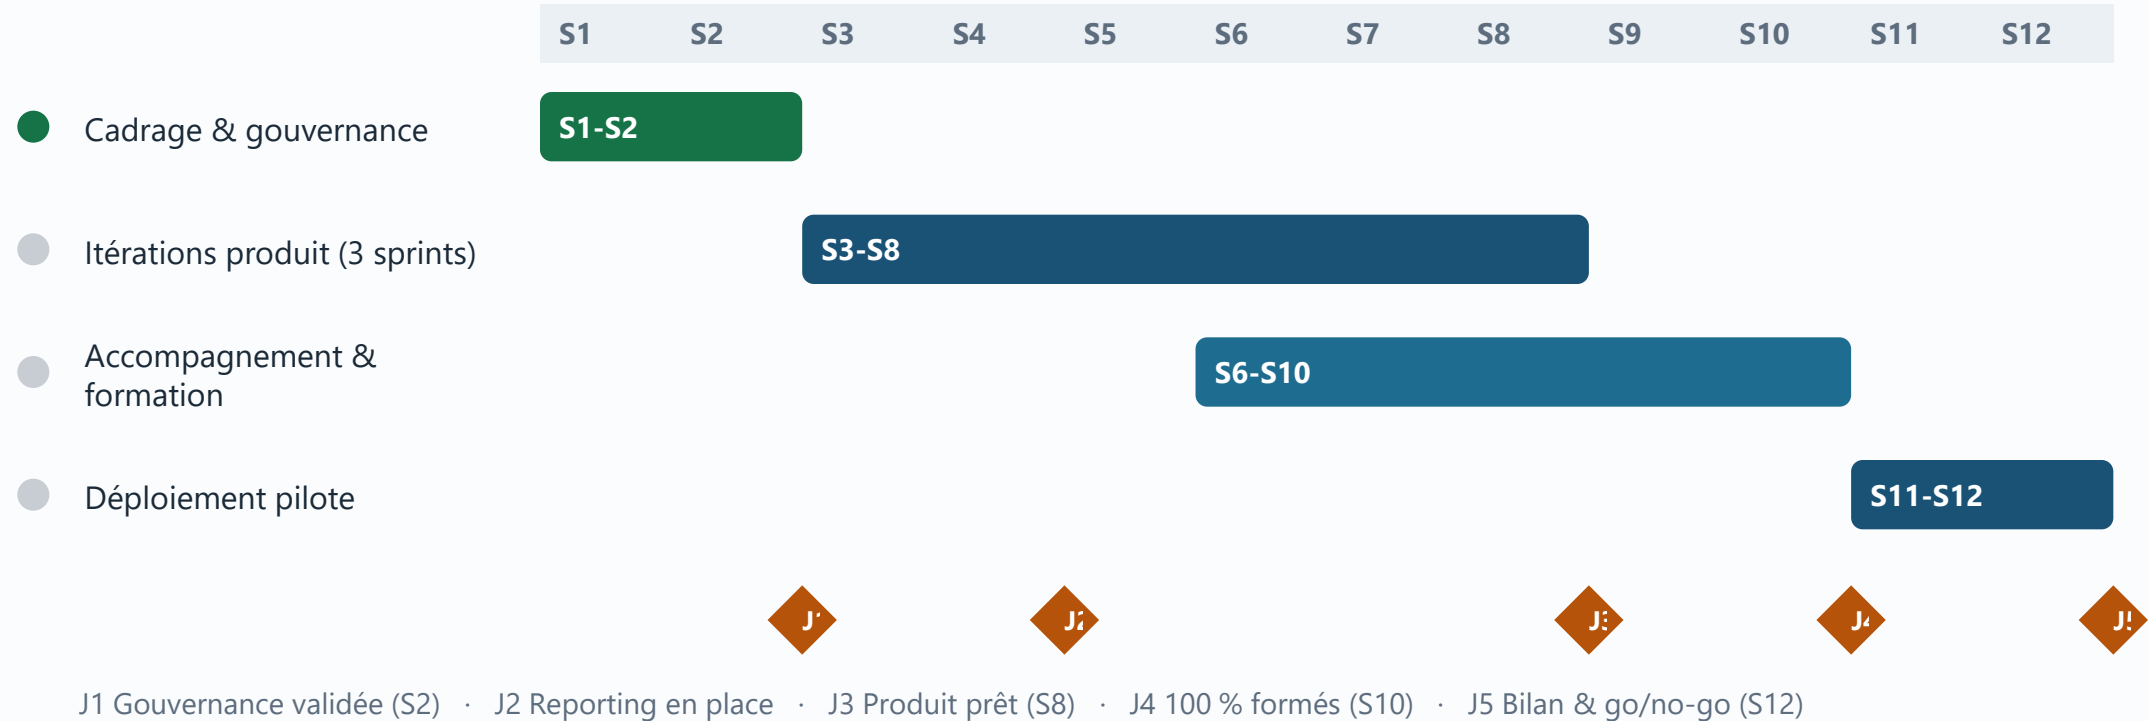

✓ Les formations se terminent avant le début du pilote.

Qui décide quoi

MÉTHODE HYBRIDE · deux natures de travail, deux modes

Sprints de 2 semaines

Produit · évolutions planifiables, cadence lisible

Flux Kanban continu

Support · flux imprévisible, file de priorités

Comité d'arbitrage hebdomadaire

Product Owner · Lead Data · référent métier · règle les conflits de priorités en jours, pas en mois.

UN SEUL RESPONSABLE PAR ACTIVITÉ

Product Owner

Priorisation du backlog

Lead Data (moi)

Planification · fiabilité des KPI · reporting

Référent accessibilité


Validation de chaque support

① Décision attendue : valider ce mode de gouvernance

Des cibles chiffrées en 4 catégories

Départ → Cible en S12

■ Départ ■ Cible S12

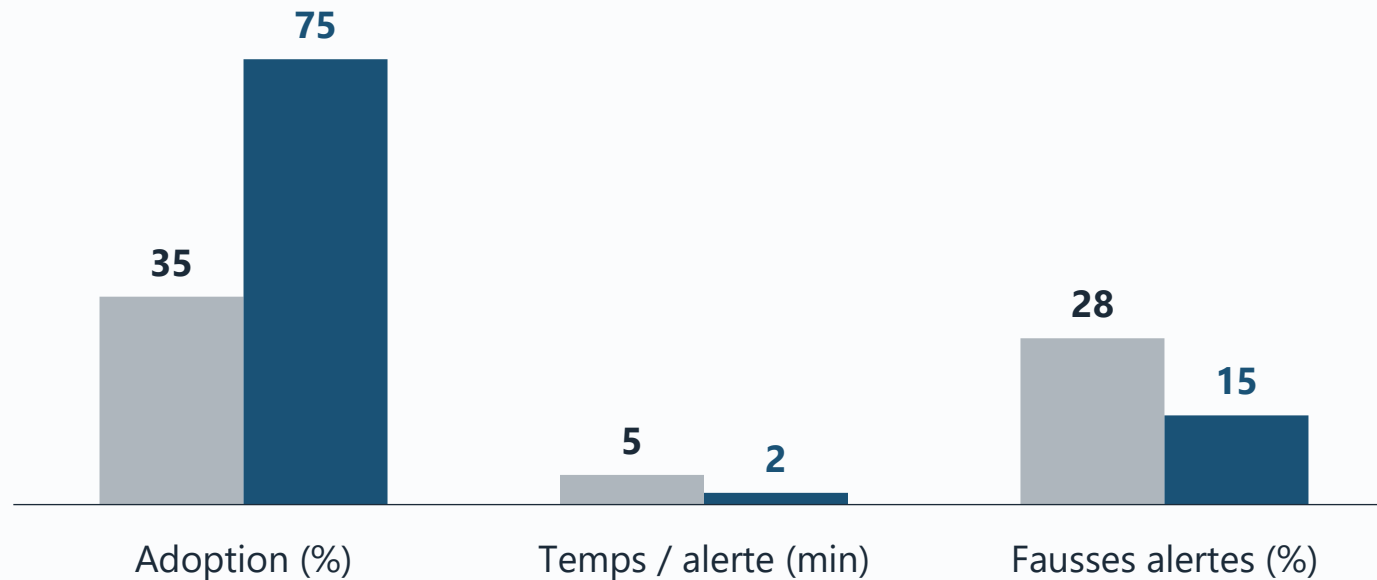

4 CATÉGORIES DE PILOTAGE

- Adoption
- Produit
- Projet
- RSE

Jalons tenus

85 % min.

Projet

Empreinte numérique

Définie S4 · suivi
mensuel

RSE

Chaque indicateur a un responsable, une formule documentée, et une action prévue en cas de dérive.

RISQUES

Top 3 et parades

6 risques au registre · voici les 3 majeurs

RISQUE

NIVEAU

PARADE

Non-adoption par les agents

• ÉLEVÉ

Formations courtes, co-construction, canal de retours structuré

Conflits de priorités IT & métier

• ÉLEVÉ

Comité d'arbitrage hebdomadaire

Accessibilité insuffisante

• ÉLEVÉ

Validation de chaque support avant diffusion

Chaque risque a un plan B avec un seuil déclencheur défini à l'avance.

Exemple : adoption sous 50 % en S8 → ateliers ciblés + accompagnement individuel en binôme.

Le terrain guide le backlog

6 retours recueillis sur le prototype, priorisés par impact et fréquence

- | | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------|
| 1 | Vocabulaire des alertes trop technique | → Libellés métier & aide contextuelle | Sprint 2 |
| 2 | Aucune procédure en cas de mauvaise alerte | → Procédure d'escalade | Sprint 1 |
| 3 | Définitions des indicateurs imprécises | → Glossaire des indicateurs | Phase 1 |
| 4 | Graphiques illisibles au lecteur d'écran | → Alternatives textuelles | Sprint 3 |

L'ordre des sprints reflète directement ces priorités. · 2 autres retours suivis au registre.

ACCOMPAGNEMENT

4 profils, 4 parcours



Superviseurs

Atelier 45 min, cas réels



Agents

Prise en main en binôme,
sur poste



Analystes

Atelier 45 min, cas réels



Accessibilité

Session dédiée, rythme
adapté

LOGIQUE D'ACCOMPAGNEMENT

Informier → Former → Accompagner sur le poste → Rendre autonome

Après le déploiement

Support en 2 niveaux avec procédure d'escalade claire

Cible

100 % formés avant le pilote · satisfaction
4/5 min.

② Décision attendue : valider ce dispositif d'accompagnement

DÉCISIONS DEMANDÉES

Les 4 décisions attendues de ce comité

Échéance

1

Valider le mode de gouvernance

S2

2

Valider le calendrier (4 phases, 5 jalons)

S2

3

Arbitrer les priorités du backlog

S2

4

Valider le dispositif d'accompagnement

S4

Prochaines étapes : lancement du cadrage · 1er reporting hebdomadaire en S3 · jalon J1 en fin de S2.

Merci. Je suis prêt à répondre à vos questions.
