

REPORTING AU COMITÉ DE DIRECTION

MobilityPulse : sécuriser le déploiement en 12 semaines

STATUT GLOBAL

• VERT · prêt à lancer

*Aucun obstacle bloquant :
lancement conforme au
calendrier*

La solution existe déjà en prototype : ma mission n'est pas de la développer, mais d'organiser son adoption en 12 semaines.

Ouassim Megrad · Lead Data · équipe Megslab

3 réponses aux 3 limites constatées

1

Organisation

Un plan projet en 12 semaines : 4 phases, 5 jalons, dépendances

maîtrisées

2

Gouvernance

Des rôles clairs (RACI) et un comité d'arbitrage hebdomadaire


3

Accompagnement

Une formation courte et accessible, adaptée aux 4 profils d'utilisateurs

PLANNING

12 semaines, 4 phases, 5 jalons

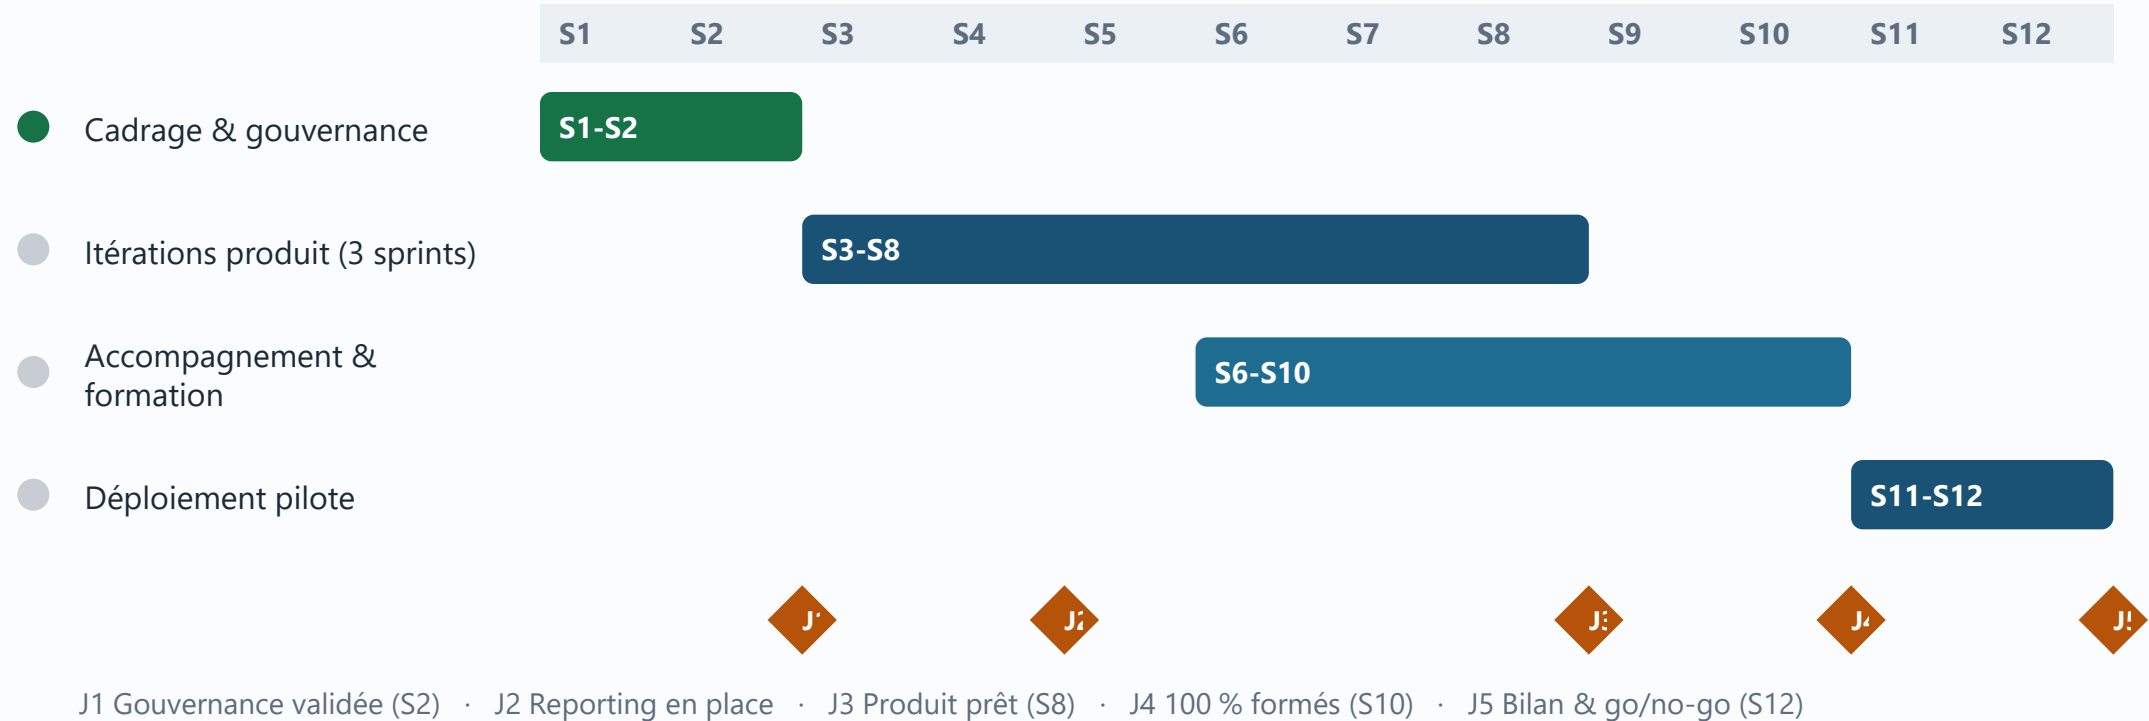

✓ Les formations se terminent avant le pilote (S10) : un pilote avec des utilisateurs non formés mesurerait

Qui décide quoi

MÉTHODE HYBRIDE · deux natures de travail, deux modes

Sprints de 2 semaines

Produit · les évolutions sont planifiables : 3 sprints de 2 semaines, cadence lisible pour la direction

Flux Kanban continu

Support · demandes imprévisibles : traitement en continu avec une file de priorités limitée

Comité d'arbitrage hebdomadaire

Product Owner · Lead Data · référent métier · règle les conflits de priorités en jours, pas en mois. Exemple : export CSV ou alertes lisibles en premier ? Le PO tranche chaque lundi en 30 minutes, éclairé par la charge et les dépendances techniques.

UN SEUL RESPONSABLE PAR ACTIVITÉ

Product Owner

Priorise le backlog et porte la valeur métier

Lead Data (moi)

Planifie le projet, garantit la fiabilité des indicateurs, rend compte à la direction

Référent accessibilité


Valide l'accessibilité de chaque support avant toute diffusion

① Décision attendue : valider ce mode de gouvernance

Des cibles chiffrées en 4 catégories

Départ → Cible en S12

■ Départ ■ Cible S12

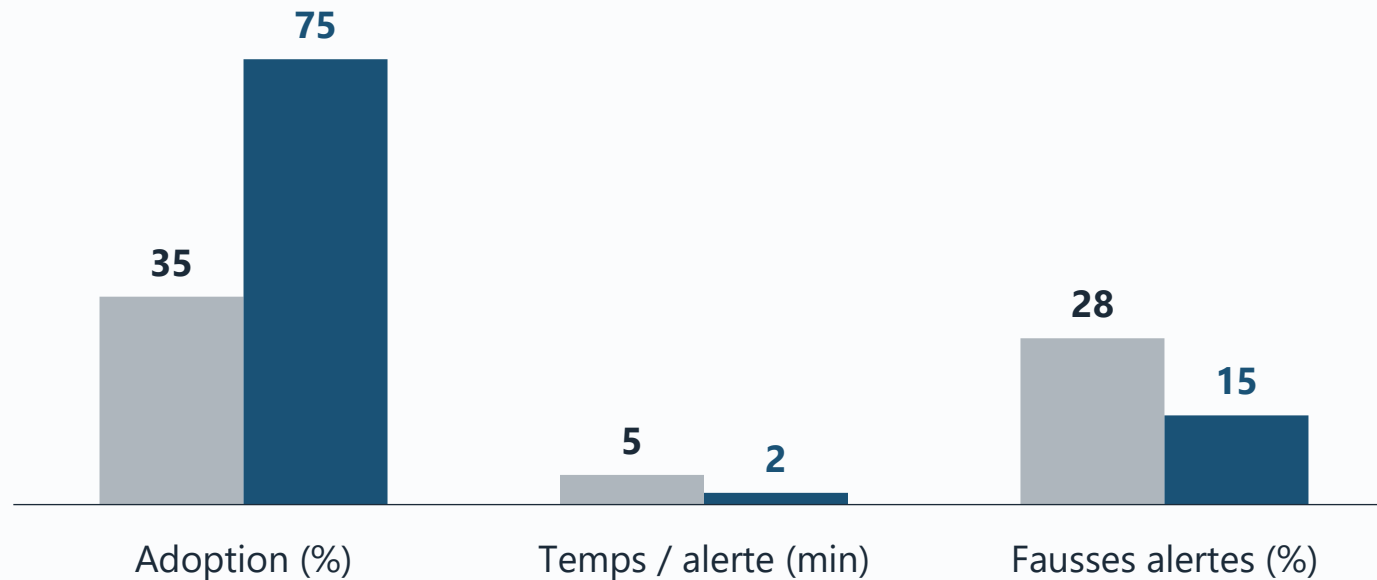

4 CATÉGORIES DE PILOTAGE

- Adoption
- Produit
- Projet
- RSE

Jalons tenus

85 % min.

Projet

Empreinte numérique

Formule définie en
S4, puis suivi
mensuel

RSE

Adoption : de 35 % à 75 % · Compréhension d'une alerte : de 5 à 2 minutes · Fausses alertes : de 28 % à 15 %. Chaque

RISQUES

Top 3 et parades

6 risques au registre · voici les 3 majeurs

RISQUE	NIVEAU	PARADE
Non-adoption par les agents	• ÉLEVÉ	Formations courtes, co-construction, canal de retours structuré
Conflits de priorités IT & métier	• ÉLEVÉ	Comité d'arbitrage hebdomadaire
Accessibilité insuffisante	• ÉLEVÉ	Validation de chaque support avant diffusion

Chaque risque a un plan B avec un seuil déclencheur défini à l'avance : la décision difficile est préparée à froid, pas dans la panique.

Exemple : adoption sous 50 % en S8 → ateliers ciblés + accompagnement individuel en binôme.

Le terrain guide le backlog

6 retours recueillis sur le prototype, priorisés par impact et fréquence

- | | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------|
| 1 | Vocabulaire des alertes trop technique | → Libellés métier & aide contextuelle | Sprint 2 |
| 2 | Aucune procédure en cas de mauvaise alerte | → Procédure d'escalade | Sprint 1 |
| 3 | Définitions des indicateurs imprécises | → Glossaire des indicateurs | Phase 1 |
| 4 | Graphiques illisibles au lecteur d'écran | → Alternatives textuelles | Sprint 3 |

Trois retours cumulent impact fort et fréquence élevée : ils passent en premier. L'accessibilité est remontée en priorité, exigence d'inclusion. L'ordre des sprints reflète directement ces priorités. · 2 autres retours suivis au registre.

ACCOMPAGNEMENT

4 profils, 4 parcours



Superviseurs

Atelier 45 min sur cas réels
+ fiche réflexe des
indicateurs critiques



Agents

Binôme sur poste : 2
sessions de 30 min sur
alertes réelles



Analystes

Atelier 45 min + glossaire
des indicateurs et exports



Accessibilité

Session dédiée : lecteur
d'écran, sous-titres, rythme
adapté

LOGIQUE D'ACCOMPAGNEMENT

Informier → Former → Accompagner sur le poste → Rendre autonome

Après le déploiement

Support niveau 1 (FAQ, réponse sous 4 h ouvrées) puis niveau 2 (équipe data), avec procédure d'escalade claire

Cible

100 % des profils formés avant le pilote ·
satisfaction 4/5 min. · participation 90 %
min.

② Décision attendue : valider ce dispositif d'accompagnement

DÉCISIONS DEMANDÉES

Les 4 décisions attendues de ce comité

Échéance

1

Valider le mode de gouvernance

S2

2

Valider le calendrier (4 phases, 5 jalons)

S2

3

Arbitrer les priorités du backlog

S2

4

Valider le dispositif d'accompagnement

S4

Prochaines étapes : si vous validez aujourd'hui, le cadrage démarre immédiatement et le premier comité d'arbitrage se tient dès lundi · 1er reporting hebdomadaire en S3 · jalon J1 en fin de S2.

Merci. Je suis prêt à répondre à vos questions.

ANNEXE · Socle data et périmètre technique du Lead Data

Présentée uniquement en réponse aux questions du jury · hors des 10 minutes de reporting

CHAINE DE DONNEES : collecte des signaux de mobilité (bus, tramways, vélos en libre-service, capteurs de trafic), ingestion en continu et centralisation dans un entrepôt de données. Je garantis la disponibilité et la fraîcheur des données.

QUALITE DES DONNEES : contrôles automatisés (complétude, cohérence, doublons) et référentiels partagés. C'est le prérequis des tendances par ligne (B06) : sans qualité data, pas d'indicateur fiable.

DETECTION D'ANOMALIES : modèle statistique surveillé par le MLOps ; je pilote le réglage des seuils pour réduire les fausses alertes de 28 % à 15 %, condition de la confiance des agents.

RESTITUTION : API de consultation, tableau de bord interne, exports CSV pour les analystes (B05) avec gestion des permissions d'accès.

MON PILOTAGE DE LEAD DATA : formules et owners des 7 KPI documentés au glossaire (réponse au risque R06), canal de feedback structuré (B10), estimation de l'empreinte numérique par run (indicateur RSE défini en S4).

PERIMETRE : le développement relève des épreuves E2/E3. Dans ce projet, je pilote la qualité, la fiabilité et l'exploitation de ce socle : c'est ce qui fonde ma légitimité de Lead Data sur les indicateurs présentés.
